


PLANO GERAL DA REFORMA DO ENSINO MÉDICO (2003-2007), VISÃO DE CONJUNTO

- O projecto da Reforma Curricular percorrerá 42 meses, dos quais já se cumpriram 6 meses, custando USD 257.00,00 no total.
- A partir de agora (36 meses), o currículo (macro e micro desenho) estará pronto em 21 meses (até Dezembro de 2005) desde que o Plano seja aprovado e os recursos disponibilizados. O restante tempo será dispendido em actividades de divulgação e discussão, para consolidação e sustentabilidade do Currículo. Ver planificação detalhada nas páginas seguintes.
- Funcionará a Comissão Técnica, CT (—), 4 Grupos Técnicos, GT (—) e um Gabinete Permanente, GP (→).
- As decisões competem à Reitoria da Universidade (DR, aprovação do Plano e Orçamento) e ao Conselho Científico da Faculdade de Medicina (DF_x, aprovação dos produtos intermédios e do produto final, o novo currículo), assinaladas com □
- Haverá 4 workshops (↓), participaremos em 3 Conferências Internacionais (↓) e organizaremos 2 Encontros Nacionais (↓).

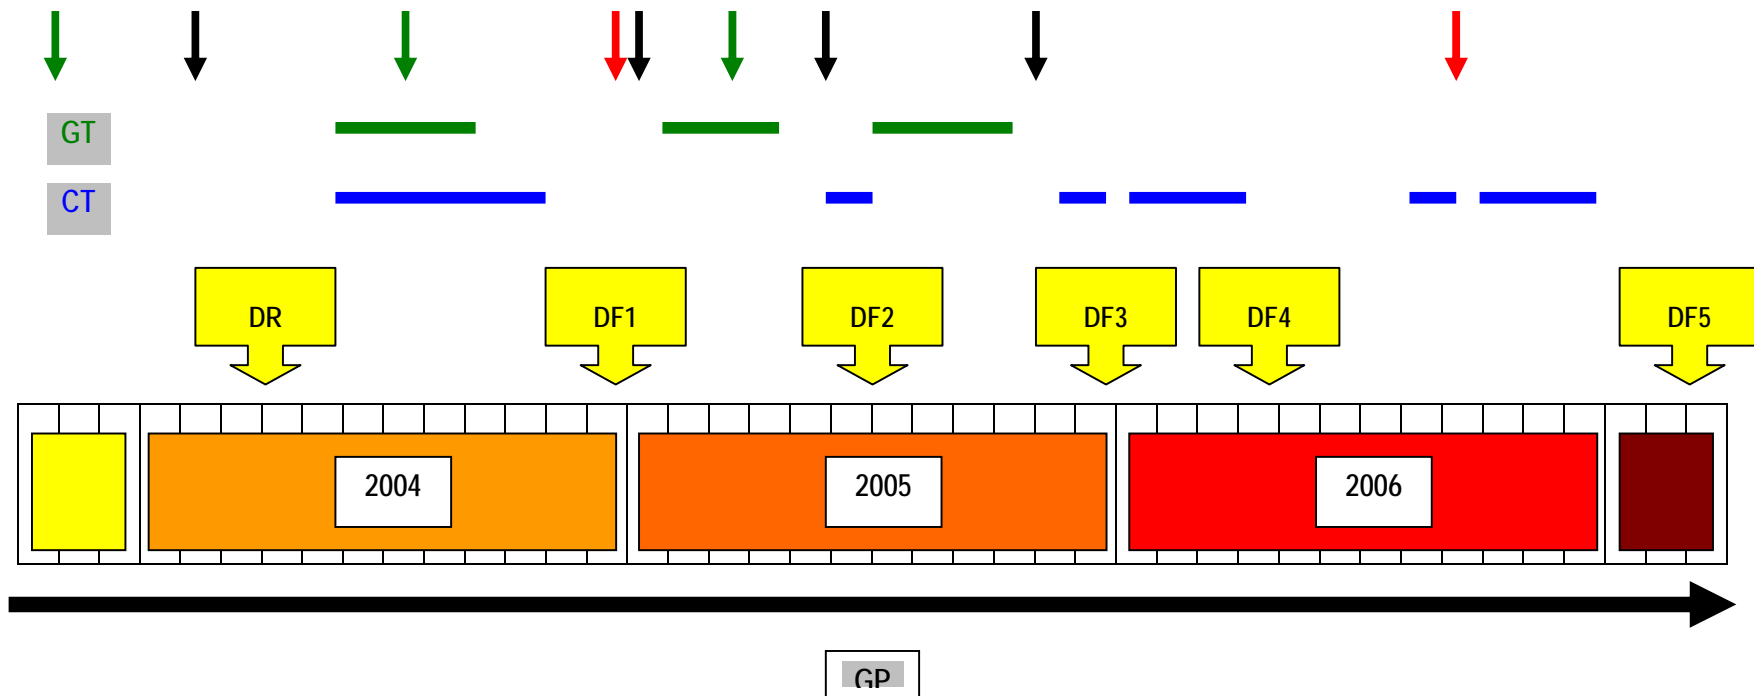

PLANO GERAL DA REFORMA DO ENSINO MÉDICO (2003-2007)

FOLHA 1: 2003-2004

N	ACÇÃO/ RESPONSÁVEL	REALIZAÇÃO	CUSTO	RESULTADO ESPERADO
GP	Gabinete do Projecto	Set03-Dez03	3000	Documentação, Expedição, Secretariado, Coordenação
CI1	Conferência Internacional 1 (exterior)	Setembro 2003 (12 dias), 1 par.	6000	Actualização, Parcerias, Integração Africana
CUSTOS 2003			9.000	
GP	Gabinete do Projecto	Jan04-Dez04	12000	Documentação, Expedição, Secretariado, Coordenação
W1	Workshop Inicial (1) C/ Perito Internacional (PI)	Janeiro 2004 (3 dias úteis)	12000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprovação das grandes linhas de força da Reforma ▪ Revisão do Plano Geral da Reforma
DR	Reitoria da UAN	Março 2004	-	Aprovação do Plano Geral e respectivo orçamento
CT1	Comissão Técnica	Mai04-Out04 (6 meses)	6000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recolha das Referências Fundamentais, estudo de Outras Experiências e consolidado ▪ Preparação de proposta de “Perfil do Médico a Formar” ▪ Planificação do Encontro para definir o Perfil do Médico, em parceria com MINSA, OMS, ORMED ▪ Organização do Encontro Nacional
GT1	Grupos técnicos (n=4)	Mai04 –Ago04 (4 meses)	8000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Levantamento do Currículo actual e anteriores ▪ Debate para analisar evolução, identificar pontos-fortes e pontos-fracos
CI2	Conferência Internacional 2 (exterior)	Julho 2004 (10 dias), 2 par.	10000	Troca de experiência, Actualização, Apresentação de Comunicação
EN1	Encontro Nacional 1 (do Perfil Profissional do Médico) c/ PI	Novembro 2004 (3 dias úteis)	50000	Discussão e Consenso sobre Perfil do Médico a Formar (Faculdade + 3 part/província + Parceiros da Reforma = 150 p.)
CT2	Comissão Técnica	Dezembro 2004	-	Relatório Final e envio à Direcção FM do Perfil
DF1	Conselho Científico Fac. M.	Dezembro 2004	-	Aprovação do Perfil do Médico a Formar
CUSTOS 2004			98.000	

PLANO GERAL DA REFORMA DO ENSINO MÉDICO (2003-2007)

FOLHA 2: 2005

N	ACÇÃO/ RESPONSÁVEL	REALIZAÇÃO	CUSTO	RESULTADO ESPERADO
GP	Gabinete do Projecto	Jan05-Dez05	12000	Documentação, Expedição, Secretariado, Coordenação
W2	Workshop 2 c/ Perito Int.ernac.	Janeiro 2005 (3 dias úteis)	12000	Formação em Macrodesenho curricular
GT2	Grupos Técnicos (n=4)	Fev 05-Abr 05 (3 meses)	6000	Macrodesenho curricular de todas as áreas epistemológicas
CI2	Conferência Internacional 3 (exterior)	Março 2005 (10 dias), 2 par.	10000	Troca de experiência, Actualização, Apresentação de Comunicação
W3	Workshop 3 c/ Perito Internc.	Maio 2005 (5 dias úteis)	15000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Discussão e consenso sobre o macrodesenho curricular ▪ Formação em Microdesenho Curricular
CT2	Comissão Técnica	Junho 2005	-	Relatório Final e envio à Direcção FM do Macrodesenho
DF2	Conselho Científico Fac. M.	Junho 2005	-	Aprovação do Macrodesenho Curricular
GT3	Grupos Técnicos (n=4)	Jul05-Out05 (4 meses)	8000	Microdesenho curricular de todas as áreas epistemológicas
W4	Workshop 4 c/ Perito Internacinal	Novembro 2005 (3 dias úteis)	12000	Discussão e consenso sobre o microdesenho curricular
CT3	Comissão Técnica	Dezembro 2005	-	Relatório Final e envio à Direcção FM do Microdesenho
DF3	Conselho Científico Fac. M.	Dezembro 2005	-	Aprovação do Microdesenho Curricular
CUSTOS 2005			75.000	

PLANO GERAL DA REFORMA DO ENSINO MÉDICO (2003-2007)

FOLHA 3: 2006-2007

N	ACÇÃO/ RESPONSÁVEL	REALIZAÇÃO	CUSTO	RESULTADO ESPERADO
GP	Gabinete do Projecto	Jan06-Dez06	12000	Documentação, Expedição, Secretariado, Coordenação
CT4	Comissão Técnica	Jan06-Mar06 (3 meses)	3000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redacção do Relatório Final (Draft1) da Reforma ▪ Elaboração do Plano Curricular aprovado (Draft1)
DF4	Conselho Científico Fac. M.	Abril 2006	-	Aprovação do Relatório final e Plano Curricular (Drafts1)
FM1	Direcção da Faculdade	Abril 2006	2500	Edição X exemplares do Relatório e do Plano (Drafts1)
FM2	Direcção da Faculdade	Mai06-Jul06	500	Divulgação dos Documentos (relatório e plano) pelos Parceiros, Corpos da Faculdade e Peritos Int.ernac. para enriquecimento
CT5	Comissão Técnica	Agosto 2006	1000	Recepção das propostas de enriquecimento e consolidado
EN2	Encontro Nacional 2 (do Relatório e Currículo) c/ PI	Setembro 2006 (3 dias)	50000	Apresentação, apreciação, discussão e consenso sobre o relatório final (draft1), plano curricular final (draft1) e consolidado de propostas
CT6	Comissão Técnica	Out06-Dez06	3000	Produção de novas versões enriquecidas do relatório final (Draft2) e do plano curricular (Draft2) e envio à Direcção FM
CUSTOS 2006			72.000	
GP	Gabinete do Projecto	Jant07-Mar03	3000	Documentação, Expedição, Secretariado, Coordenação
DF5	Conselho Científico Fac. Med.	Jan07-Mar07	-	Apreciação do Draft 2 do relatório e do plano curricular, aprovação das versões FINAIS e envio à Reitoria da UAN Resultado Final: Novo currículo, actualizado e relevante, do ensino médico na Universidade Agostinho Neto
CUSTOS 2007			3.000	
CUSTOS SET2003- MAR2007 (42 MESES)			257.000	
